旧光市立光総合病院解体工事のおしらせ

【工事概要】

工事名　　旧光市立光総合病院解体工事
工事場所　　光市虹ケ浜2 丁目10-1 外
工事期間　　令和5年11月6日～令和7年3月20日（予定）
発注者　　光市病院事業管理者
施工者　　東亜・時盛特定建設工事共同企業体
　　工事責任者　岩井　　現場代理人　小番（こつがい）主任技術者　藤本　健一
連絡先　　0833-48-5855

【工程表】

作業時間は原則として8時～17時とし、日曜日は休工とします。

項　目	令和６年　3月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
足場解体（外側）	北側外壁足場																														
アスベスト除去	北側外壁除去																														
内装解体	北側・中央F1			F2																											
内装解体	北側・中央F1			F2																											
躯体解体																									北側F1・F2						

【施工内容】

令和6年3月度の工事は、内外壁のアスベスト除去と終了箇所の足場の一部を解体致します。
加えて、内装の解体、スクラップ搬出、建物の一部解体が主な予定となります。
アスベストの除去は中央付近から西側へ向かって行います。
内装撤去は引続き北側及び中央付近を施工して、順次廃材の搬出も行います。
北側の内装撤去後、下旬には北側の建屋一部を解体する予定です。
３月より工事車両の公道への出入りが多くなるため、現場出入口には誘導員を配置します。
近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、アスベスト含有物の除去等、環境対策に
十分考慮して作業を行います。

【仮設計画】

【凡例】
- 仮設足場（防音シート）
- 仮囲い（万能鋼板　高さ3m）
- キャスターゲート（高さ1.8m）
- 誘導員
- 騒音振動計

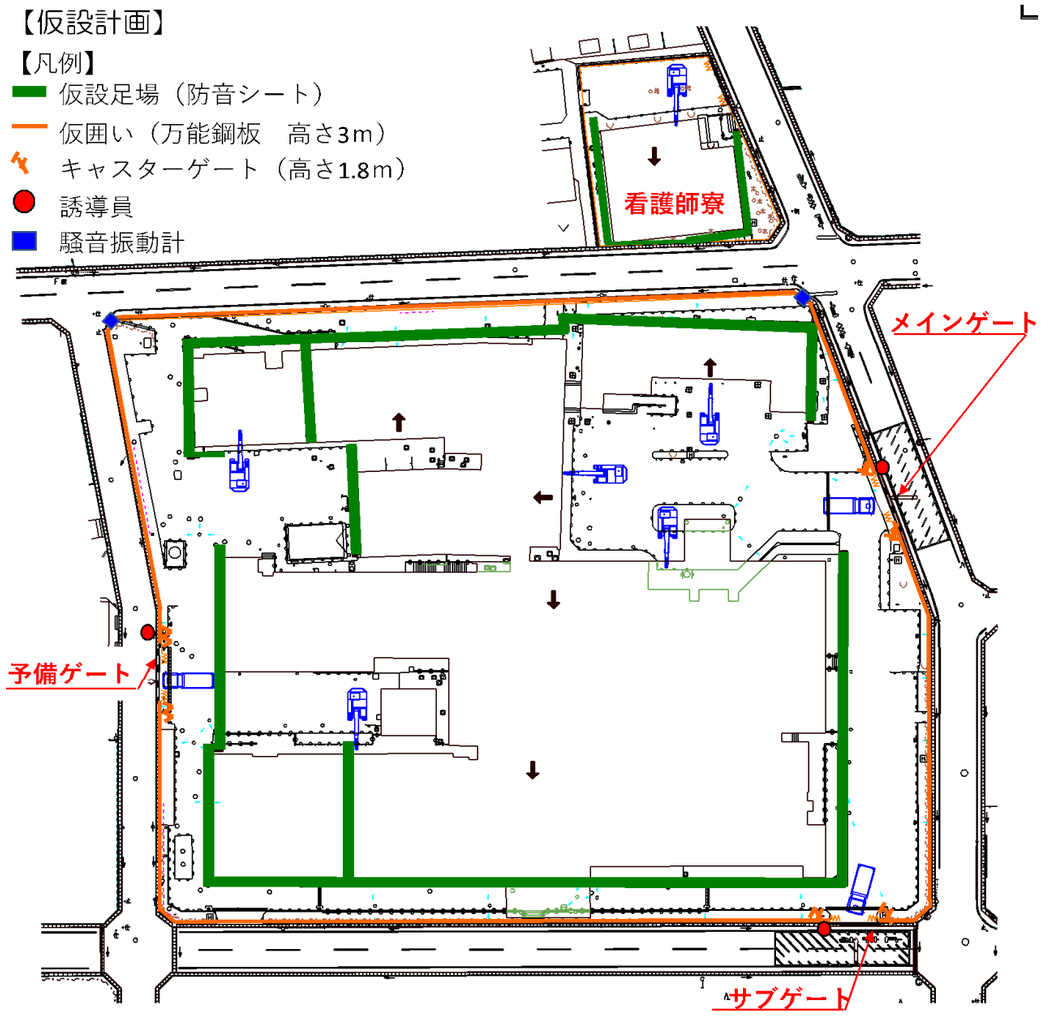

【交通安全対策】

①一般車両の通行を妨げることの無いよう、
　交通誘導員を配置し出入口の誘導を行います。
　（※仮設計画参照）
②制限速度の遵守、過積載の防止等交通法規の
　遵守を徹底します。
③安全意識高揚の為「交通安全マップ」及び
　「注意事項」を運転席に掲示します。

誓約書

1. 常に交通法規を守り、正しい運転を実践します。
2. 危険を予測して、慎重な運転に努めます。
3. 安全確認は指差呼称を実践します。
4. 歩行者を守る優しい運転に努めます。
5. 飲酒運転を絶対にしません。

現場のルール・注意事項

1. 現場進入路（現場敷地外）での駐車禁止
2. 周辺道路での停車による時間調整禁止
3. タイヤが汚れた場合は、洗浄後に退場する
4. 現道に出る際の一時停止の徹底

図１．注意事項

【粉塵・泥・騒音・振動対策】

①解体時はシート養生及び散水により、ほこりの飛散を防止します。
②道路上はこまめな清掃を行います。
③敷地境界に騒音振動測定を設置し、計測値を表示します。（1月中旬）
④建設機械は、低振動・低騒音型を使用し、振動・騒音の低減します。
⑤工事区域全周に仮囲い、解体養生足場（防音シート張り）を設けて
　騒音振動粉塵を低減します。

【環境対策】

<アスベスト類対策>
①事前調査の結果を掲示し、法に則り適正に飛散養生、アスベストの撤去を行います。

【その他】

①近隣既設建物および道路施設等は損傷することのないように配慮し、万一損傷を与えた時は
　速やかに原型復旧します。
②着手前に監督職員及び近隣施設管理者立会いの上、写真等で現状の把握確認を行います。
